




Bauablaufplan Hohe Straße in Sersheim

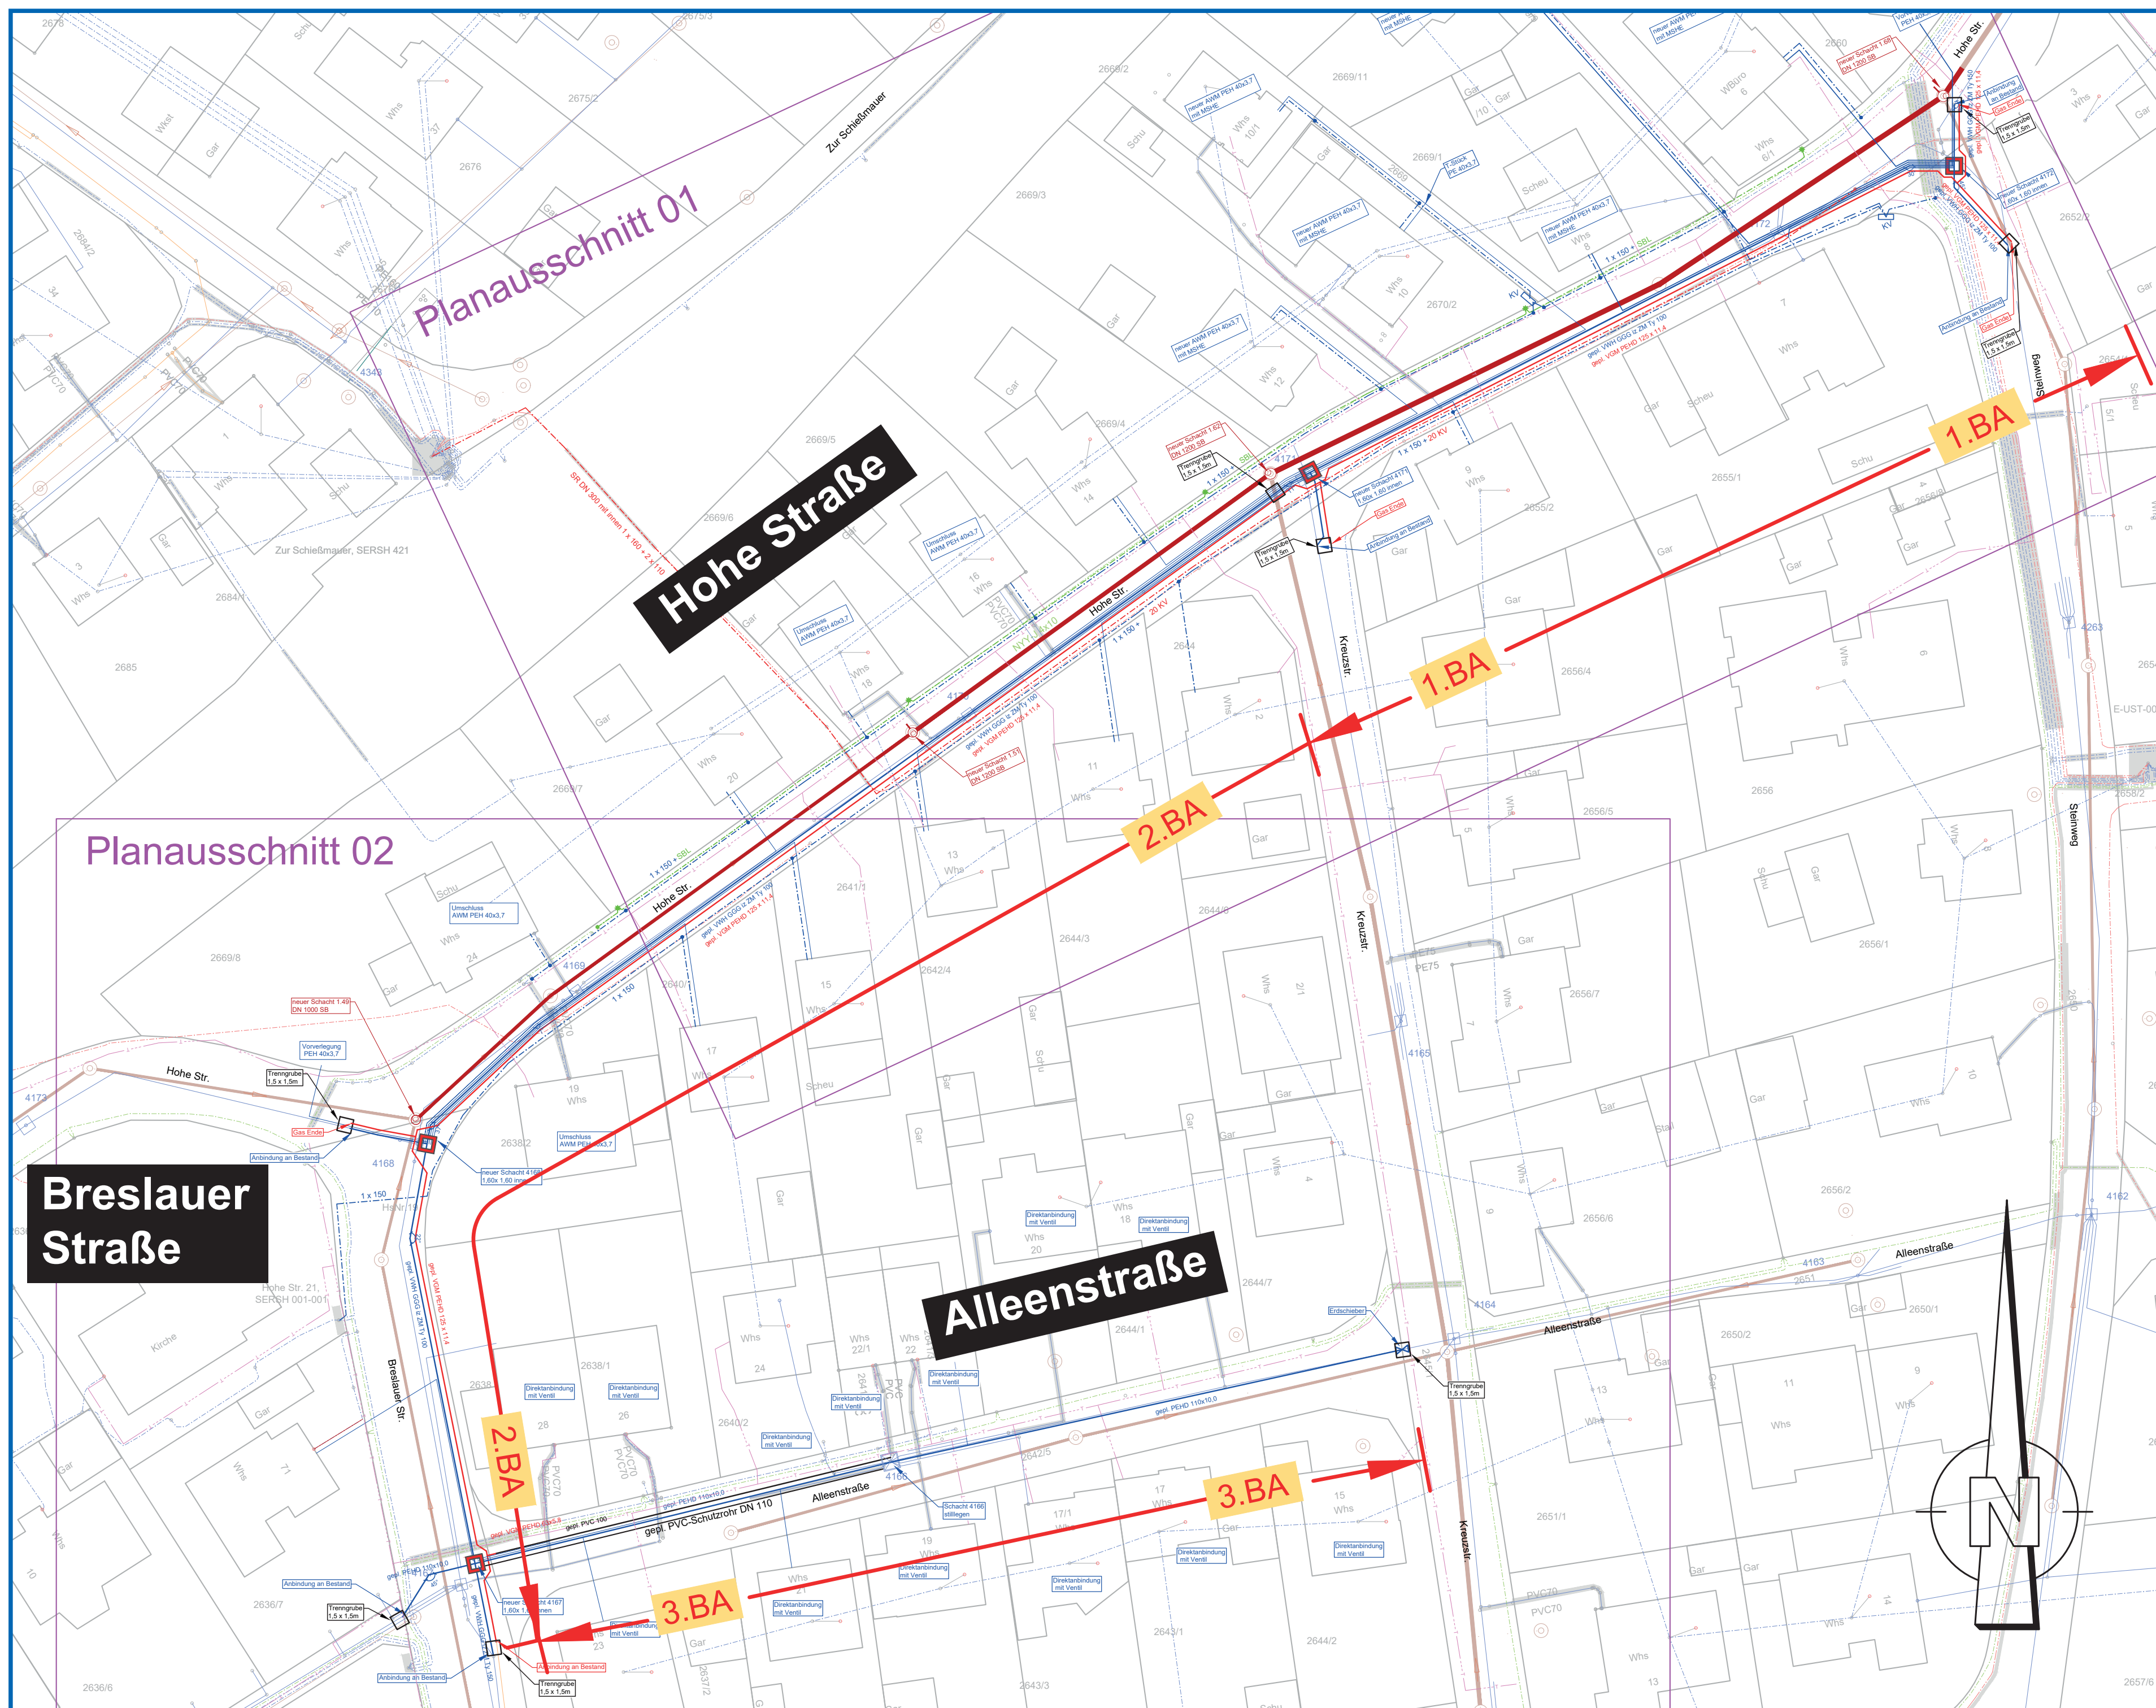

Nr. Vorgang	Beginn	Ende
01 Erneuerung Kanal, Gas/Wasser/Strom/LWL und Ausbau der Strasse	22.05.23	30.04.24
02 Baustelle einrichten	22.05.23	24.05.23
03 Diverse Vorarbeiten (Notversorgung /Fräsen u.dgl.)	24.05.23	02.06.23
04 Kanalbau zwischen Steinweg und Breslauer Straße (Abschnitt 1 u. 2)	05.06.23	29.09.23
05 Sommerferien	14.08.23	01.09.23
06 Abschnitt 1 u. 2 zwischen Steinweg und Breslauer Straße	18.09.23	20.12.23
07 Gas/Wasser	18.09.23	10.11.23
08 Sparten	16.10.23	17.11.23
09 Strassenbau	02.11.23	20.12.23
10 Winterferien	21.12.23	12.01.24
11 Abschnitt 3 zwischen Kreuzung Hohe Str./Breslauer Str. und Alleenstraße	15.01.24	29.02.24
12 Gas/Wasser	15.01.24	09.02.24
13 Sparten	06.02.24	29.02.24
14 Abschnitt 4 zwischen Steinweg und Oberriexinger Straße	05.02.24	01.03.24
15 Strassenbau	05.02.24	01.03.24
16 Abschnitt 4a Oberriexinger Straße und Grünfläche am Backhaus	04.03.24	30.04.24
17 Strassenbau	04.03.24	30.04.24

LEGENDE

Bestand:

- Kanal Mischwasser
- Kanal Schmutzwasser
- Kanal Regen-/Oberflächenwasser
- Wasserleitung
- Gasleitung Niederdruck
- Gasleitung Mitteldruck
- Lichtwellenleiter
- Straßenbeleuchtung
- Strom Niederspannung
- Strom Mittelspannung
- Fernwärme/-kälte Vorlauf
- Fernwärme/-kälte Rücklauf
- Fernwärme Doppelrohr
- Telekom / Vodafone

Planung:

- Kanal Mischwasser
- Kanal Schmutzwasser
- Kanal Regen-/Oberflächenwasser
- Wasserleitung
- Gasleitung Niederdruck
- Gasleitung Mitteldruck
- Lichtwellenleiter
- Straßenbeleuchtung
- Strom Niederspannung
- Strom Mittelspannung
- Fernwärme/-kälte Vorlauf
- Fernwärme/-kälte Rücklauf
- Fernwärme Doppelrohr
- Rückbau Leitung

**Bei Fragen zum Bauablauf
wenden Sie sich bitte an:**

**A.T.S.-Bau GmbH
Herr Karaarslan (Polier)
Mobil: 0151-68963312**
